ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

Stavba: **"Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin"**
Investor: **Obec Klin**
Dodávateľ: **ŠPORTFINAL s.r.o.**

Doba realizácie - 9 mesiacov

Objekt	č.	Popis prác	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8.mesiac	9. mesiac
SO 01 SKOK DO DIAĽKY S ROZBEŽÍSKOM	1.	Vytýčenie stavby a inžinierskych sietí									
	2.	Demontáž umelého trávnika									
	3.	Podkladové vrstvy									
	4.	Osadenie odrazovej dosky									
	5.	EPDM povrchy +vybavenie +ter. úpravy									
SO 02 IHRISKO PRE MINIFUTBAL	1.	Vytýčenie stavby									
	2.	Výkopové práce									
	3.	Realizácia trativodov									
	4.	Základové konštrukcie + mantinely									
	5.	Umelý trávnik +vybavenie +ter. úpravy									
SO 03 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	1.	Vytýčenie stavby									
	2.	Výkopové práce									
	3.	Realizácia trativodov									
	4.	Základové konštrukcie									
	5.	EPDM povrchy +vybavenie +ter. úpravy									
SO 04 SPEVNENÉ PLOCHY	1.	Vytýčenie stavby									
	2.	Výkopové práce									
	3.	Podkladové vrstvy									
	4.	Základové konštrukcie									
	5.	Pokládka zámkovej dlažby									
SO 05 VRH GUĽOU	1.	Vytýčenie stavby									
	2.	Výkopové práce									
	3.	Realizácia trativodov									
	4.	Základové konštrukcie									
	5.	Leštený betón +vybavenie +ter. úpravy									
SO 06 SEKTOR PRE ROZCVIČOVANIE	1.	Vytýčenie stavby									
	2.	Výkopové práce									
	3.	Realizácia trativodov									
	4.	Základové konštrukcie									
	5.	Vybavenie +ter. úpravy									
SO 07A OBILIÁR	1.	Vytýčenie stavby									
	2.	Výkopové práce									
	4.	Základové konštrukcie									

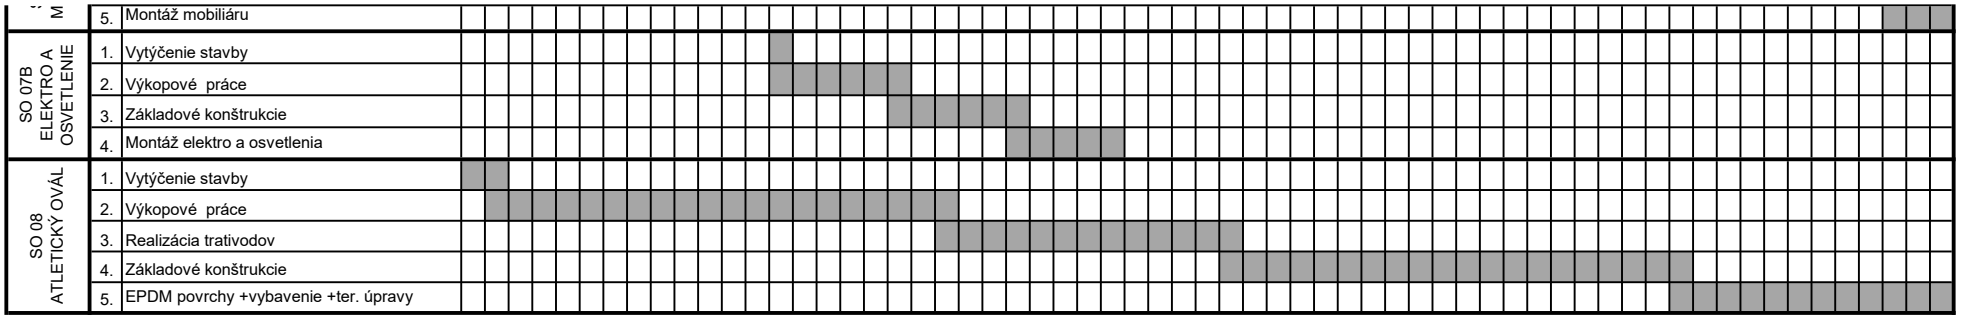

V Bratislave dňa 12.7.2023

Spracoval: Ing. Cyril Špendla
